SASKANOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehniskās līdzekļu uzstādīšanu sēt nosaukumu izmaiņas uz tā izvietojuma atbilstību Rīcībspējīgam lēmumam ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izpildei un uzraudzī saskaņā ar LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTSCEĻI
Rīcības rajons
ceļu satiksmes
K. UNGURS

9.02.2020

APZĪMĒJUMI

- Ceļa darbu vieta
- Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr
- Pagaidu ceļa zīmes Aizklāšana
- Esošas ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr
- Šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi; maksimāli 2 m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu. Signāluguns uz katra otrā vadstatņa.
- Garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr. 908/909; maksimāli 10m attālumā cits no cita,tumšā diennakts laikā divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.
- Palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai
- Speciāli aprīkots transportlīdzeklis (darba mehānisms) vai pārvietojamais ceļa zīmju vairogs
- Apbraucamais ceļš
- Slēgtais posms

Objekta atrašanās vieta

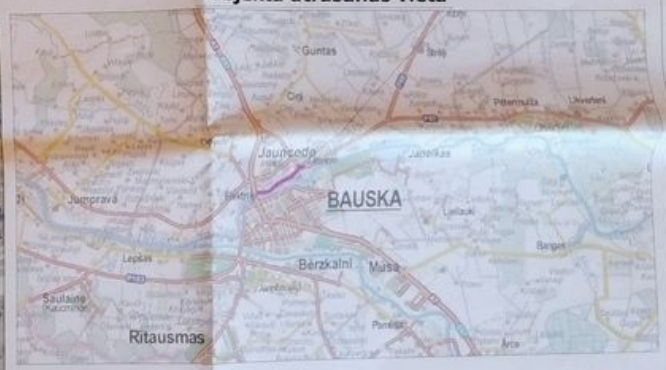

PIEZĪMES

1. Ceļa aprīkojumu uzstādīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veis: SIA "VIA", Starta iela 5, Rīga, LV-1026

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Gints Gruntiņš, tel. 29226151

3. Shēmas darbības laiks - no 17.02.2020 līdz 17.06.2020 atbilstoši būvdarbu kalendārajam grafikam.
4. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
5. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kuras ar darba vietas aprīkojuma shēmas esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).
6. Darbu veicējam SIA "VIA" jāveic pasākumi gājēju drošībai objekta zonā.

Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgtā posma objiektiem. Slēdzot nobrauktuves uz īpašumiem, informēt iedzīvotājus par darbu izpildes termiņiem.

8. Aizklāt vai demontēt stacionārās ceļa zīmes, kuru nozīme ir pratrunā ar pagaidu ceļa zīmēm.
9. Darbus veikt pa posmiem, kuri norādīti shēmā.

Brīvās kājāmejas platāka (2.2 x 1.5 m)

UZMANĪBU! UZ CEĻA STRĀDĀ

SIA "VIA"
Starta iela 5, Rīga, LV-1026
tālr. 29226151, 26 2363 fakss 70 0256
komercreģistrācijas Nr 40103 ...

Saava-LV

Izstrādāja	D.Kārne mob. 26495814 e-pasts: dzintars.karne@gmail.com	13.02.2020	
Pasūtītājs	SIA "VIA", Starta iela 5, Rīga, LV-1026		
Objekts	Valmieras ceļa - valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle posma (no km 0,217 līdz km 1,290) jaunbūve Bauskā	Stadija TP	Marķa GT	Lapas Nr 1
	Ceļu satiksmes organizēšanas tehniskās līdzekļu uzstādīšanas shēma	Mērogs: bez mēroga	

Shēma Nr.4
